


Påminnelse inför montage/leverans av stålstomme


2024-03-11

- ☐ Vägbeskrivning till montageplatsen med kundens adress och telefonnummer skall sändas till oss via e-post i god tid före montagesstart.
- ☐ Samtliga förberedande arbeten såsom grund- och markplanering i anslutning till montageplatsen skall vara fullt avslutade innan montagearbetet påbörjas.
- ☐ Framkomlig väg och vändplats skall finnas. Marken skall vara så avplanad och hårdgjord att den är farbar med lastbil och kran, vilka fritt skall kunna röra sig såväl inuti som runt om byggnaden (vid behov även snöröjd).
Är grundplattan gjuten vid montaget skall det finnas uppfart till plattan.
Erfordras förstärkning, återställande och/eller lagning av nämnda platser eller vägar utföres och bekostas detta av beställaren.
- ☐ Erforderlig yta för rationell uppläggning av konstruktionsdelar skall finnas tillgänglig i direkt anslutning till montageplatsen.
- ☐ Samtliga svetsplattor skall vara utmärkta på ett varaktigt sätt enligt planritning och rätt ingjutna i höjd och i våg (se ritning K2). Vid bultgrupper skall dessa vara rätt ingjutna i höjd och sidled. Samtliga muttrar i varje bultgrupp skall vara avvägda. Svetsplattor och gängade stänger skall vara rengjorda från grus och betong, vid undermåligt utförande faktureras merkostnaden.



BESTÄLLAREN SVARAR FÖR ATT HÄR VISADE SVETSPLATTOR BLIR RÄTT INGJUTNA I HÖJD OCH I VÅG.
DÄREFTER UTMÄRKER BESTÄLLAREN PÅ VAR-
AKTIGT SÄTT PÅ VARJE PLÅTTA ÖVAN
ANGIVNA LINER OCH SVARAR FÖR DESS RIKTIGHET.
SAMTLIGA SVETSPLATTOR SKALL RENGÖRAS
FRÅN GRUS OCH BETONG. ABT-BALKEN FÖRBEHÅLLER
SIG RÄTTEN ATT DEBITERA BESTÄLLAREN FÖR MER-
KOSTNADEN VID FELAKTIGT UTFÖRANDE.

INGJUTNINGSTOLERANS:
LÄGE I SOLELD +/- 10 MM
LÄGE I HÖJDELD +/- 5 MM
LUTNING 0,5

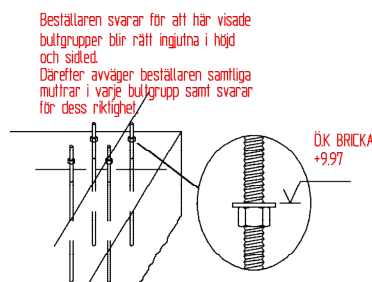

Beställaren svarar för att här visade bultgrupper blir rätt ingjutna i höjd och sidled.
Därefter avväger beställaren samtliga muttrar i varje bultgrupp samt svarar för dess riktighet.

- ☐ Belysning samt elkraft invid byggnaden för minst 2 svetsaggregat säkrade till 25 amper (3-fas 220/380 volt / utan jordfelsbrytare), tillgång till arbetsbod (el. liknande utrymme) och vatten skall tillhandahållas kostnadsfritt på montageplatsen.
- ☐ Stagningsmaterial skall finnas tillhands på montageplatsen för stagning av balkens överram i en till tre årader. I annat fall tillhandahålls materialet av ABT-Balken AB mot debitering. Behovet av stagning bedöms av ABT-Balken AB.
- ☐ Arbetet kan utföras utanför ordinarie arbetstid.
- ☐ Brandbevakning och eventuella förberedelse av heta arbeten bekostas av beställaren.
- ☐ Avsugning av stålstommen skall ske i samband med montaget. Har ingen sådan avsugning skett direkt vid avslutat montage anses ABT-Balken AB:s åtagande godkänt och avlämnat.
- ☐ Sker enbart leverans skall avlastning av gods och erforderlig upplagsyta kostnadsfritt ombesörjas.

Adress:
Olvägen 20
342 50 Vislanda

Telefon:
0472-34076
Fax:
0472-34435

BG:
574-9569
Org.nr:
556146-9064

Internet:
www.abt-balken.se
E-post:
info@abt-balken.se
